

上海市建设工程建设机械年度检验

No.

合 格 证

机械类别 汽车起重机

型 号 JQZ(QY100)

设备单位 上海东重机械设备安装工程有限公司

34293

设备号 NJBH191415

车牌号：湘 A34293

有效日期
至 2020 年 07 月 23 日



发证单位：上海市建设机械检测中心有限公司

名称	序号	检 测 项 目	要 求	结 果	备 注
机 构 和 制 动 器	19	运动零件的保护	所有外露的、在正常情况下可能发生危险的运动零件均应装设防护装置	合格	
	20	制动器	起升、(用钢丝绳起落起重臂的)变幅机构必须采用常闭式的制动器	合格	
	21	变幅	起重臂的起落必须依靠动力系统	合格	
	22	回转	回转机构应具有两个方向的可控滑转性能, 行走时转台应能锁定	合格	
	23	防止过载的安全装置	应设置	合格	
	24	平衡阀、液压锁	与执行机构必须是刚性连接	合格	
	25	急停开关	电力驱动的必须设置能切断总电源的紧急开关。内燃机驱动的应在上车操纵室中设置熄火装置	合格	
操 纵 及 电 气 系 统	26	电气联接	接触良好, 防止松脱, 导线、线束应固定可靠	合格	
	27	零位保护	控制起重机构运动的所有控制器, 均应有零位保护	合格	
	28	操纵手柄、踏板	应有表明用途和操纵方向的清楚标志	合格	
	29*	起重量指示器	起重量小于16t的起重机, 必须装设起重量指示器, 且有效	无此项	
	30*	力矩限制器	起重量16t及16t以上的起重机, 必须装设力矩限制器, 且有效	合格	
	31*	起升高度限位	应装, 并能可靠报警和停止起升	合格	
	32*	幅度限位	钢丝绳变幅的起重机应装设	无此项	
安 全 装 置 及 设 施	33	水平仪	起重量大于或等于16t的起重机应设置水平仪	合格	
	34	防臂架后倾装置	钢丝绳变幅的起重机应装	无此项	
	35	臂架角度指示器	应装, 便于操作者观看, 读数清晰	合格	
	36	风速仪及报警	起升高度大于50m 的桁架臂式起重机, 应在臂头设风速仪并能报警	无此项	
	37	联锁保护装置	可两处操作的起重机应设, 以防同时操作	无此项	
	38	作业用音响联络信号	应装有喇叭, 音响清晰	合格	
	39	安全警告图案	吊钩钢板、起重臂头部、转台尾部等突出部位, 应按规定涂刷警告图案	合格	

示: 1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查, 做好维保及记录工作;
 2. 工作地面应坚实平整, 设备移位时应保证路面地耐力及整机稳定性。

填写日期: 2017年6月1日

附表一

资料检查

序号	项 目	要 求	结 果	备注
1	使用说明书	应有, 与所验设备相符	合格	
2	出厂合格证	应有, 与所验设备相符	合格	
3	自验(试吊)记录	应由有关人员签字	合格	

附表二

设备检查

名 称	序 号	检 测 项 目	要 求	结 果	备 注
标	1	产 品 铭 牌	生产厂、名称、型号齐全并固定于明显处	合 格	
准	2	起 重 性 能 标 牌	应有额定起重量表、起升高度曲线标牌, 固定在操作者便于看到的位置	合 格	
单	3	安 全 标 志	应在主臂适当位置用醒目的字体写上“起重臂下严禁站人”字样	合 格	
单	4*	主 要 结 构 件 外 观	外观无可见裂纹、严重变形和腐蚀	合 格	
构	5	主 要 结 构 件 连 接 螺栓及销轴轴端固定	应齐全、紧固	合 格	
结	6	支 腿	伸缩自如, 收回后固定可靠; 支承盘和支腿连接可靠	合 格	
构	7	焊 补 痕 迹	应无, 有则报废	合 格	
吊	8	挂 绳 处 断 面 磨 损 量	磨损量≤原高度5%, 超过则报废	合 格	
钩	9	整 体 外 观	无可见裂纹、破口, 有则报废	合 格	
钩	10	危 险 断 面 及 钩 筋 处	无明显变形, 有则报废	合 格	
钩	11	防 脱 钩 保 险 装 置	应有	合 格	
钢	12*	钢丝绳完好度	符合 GB/T5972 要求	合 格	
丝	13	起 重 钢 丝 绳 选 用	应采用不旋转、无松散倾向的钢丝绳	合 格	
丝	14	在 绳 筒 上 的 排 列	应整齐	合 格	
绳	15	在 绳 筒 上 最 少 余 留 圈 数	应>3圈	合 格	
绳	16	钢丝绳端部固定	有放松和门紧装置	合 格	
绳	17	绳 筒 两 侧 边 缘 的 高 度	应超过最外层钢丝绳1.5倍钢丝绳直径	合 格	
滑	18	滑 轮 防 钢 丝 绳 跳 槽 装 置	应完整, 可靠	合 格	

式生效日期: 2017年6月1日



160901341139



中国认可
检测

TESTING

CNASL0857

SICCM/QR/IR/013/1.1

报告编号：

1907232504

合格证编号：

NJBH191415

建设机械年度检验报告

设备名称：

汽车起重机

委托单位： 上海东重机械设备安装工程有限公司



2019年07月25日

上海市建设机械检测中心有限公司



汽车和轮胎起重机年度检验报告(编号: 1907232504)

SICCM/QR/R/013/1.1

汽车和轮胎起重机年度检验报告

委托单位 上海东重机械设备安装工程有限公司 合格证编号 NJBH191415

检测日期 2019 年 07 月 24 日

天气 晴

检验地点	李宝北路98号		设备型号	JQZ (QY100)	
设备生产厂	三一汽车制造有限公司		设备编号	34293	
出厂年月	2010.11		出厂编号	10TC01005532	
行驶证号	4310004141230		车牌号	湘A34293	
主要技术参数	额定起重量:	100 t; 臂长(主/副):	52/18 m		
检验依据	GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》 GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分: 总则》				
检验结果	保证项目不合格数	0	一般项目不合格数	0	资料齐
合 格	签发日期: 2019年07月25日				

;

目


准: 合格 审核: 王玉国 检验专用章
说明: 1. 根据汽车和轮胎起机构造或实际安装状态, 如对应表列项目无检验内容, 则在“结果”栏目中注明“无此项”。
2. 检验项目中带*记号的项目系保证项目, 其他为一般项目, 依据检验情况分合格、整改合格、不合格三级, 判断标准如下:

级别	保证项目	一般项目不合格数	资料
合格	无不合格项	< 4 项	齐全
整改合格		整改后达到合格要求	
不合格		整改后未达到合格要求	
使用仪器			

序号	仪器名称	仪器编号
1	吊称	1-35
2	游标卡尺	1-44
3	卷尺	1-64

首次生效日期: 2017年6月1日

第 1 页 共 3 页

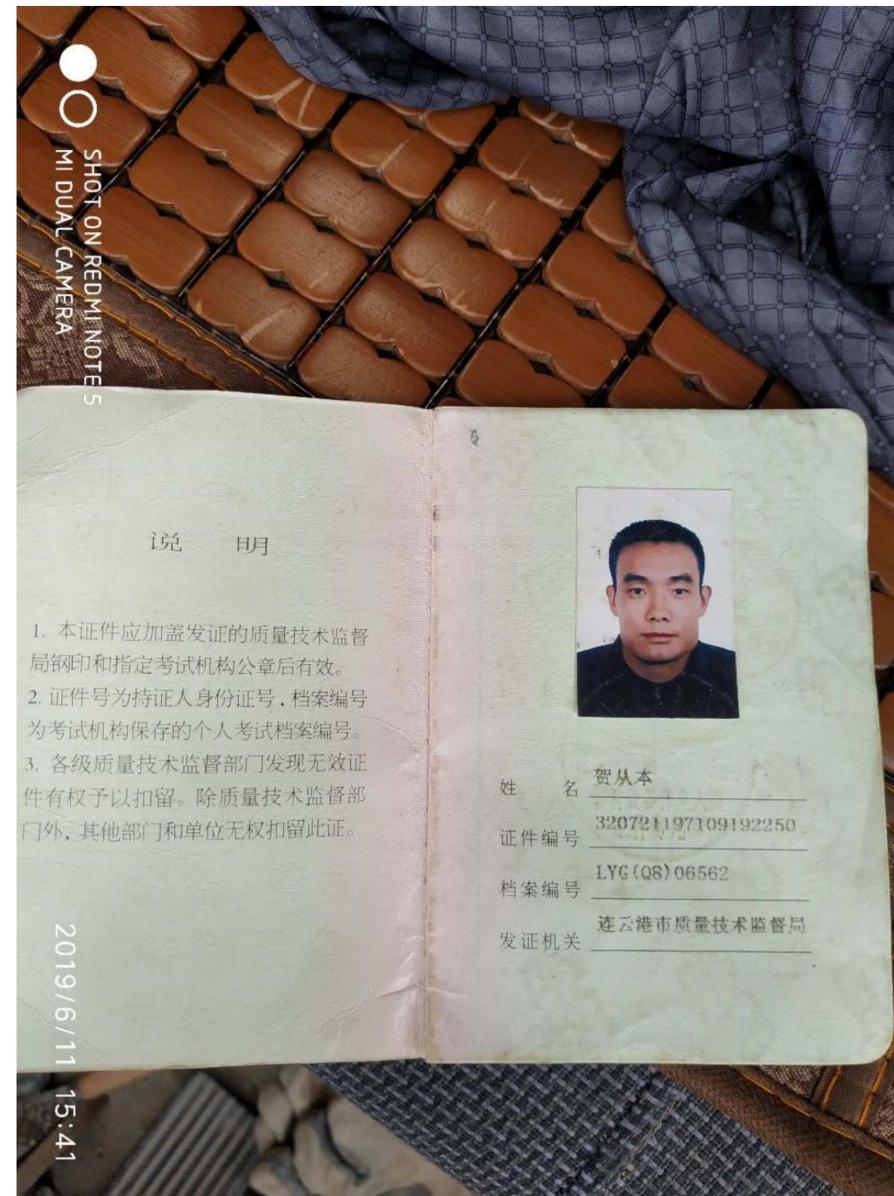

SHOT ON REDMINOTE 5
MI DUAL CAMERA

复审记录

复审合格项目代号： 	复审合格项目代号： 有效期至： 经办人章 复审机关盖章
复审合格项目代号： 有效期至： 经办人章 复审机关盖章	复审合格项目代号： 有效期至： 经办人章 复审机关盖章
